

UZMANĪBU!
Dzelzceļa pārbrauktuve
no **24.11.2026** plkst. **07.00**
līdz **27.11.2026** plkst.**21.00**
TIKS SLĒGTA!

Informatīvas zīmes uzstādīt vismaz nedēļu pirms darbu veikšanas



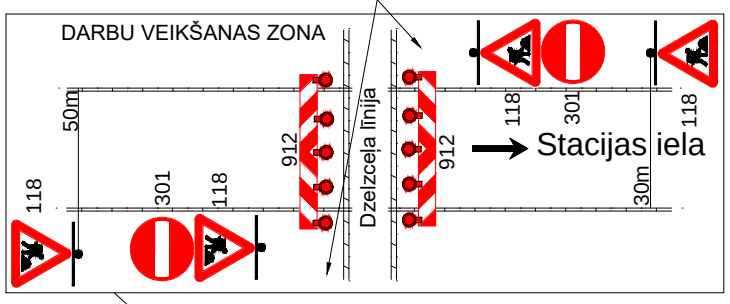

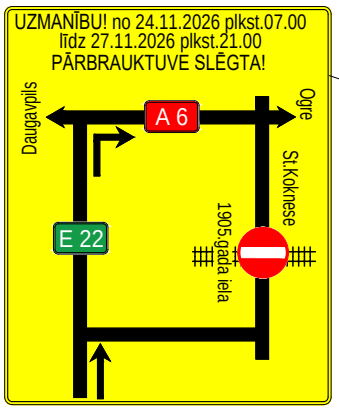

Piezīmes:
-Ceļa aprīkojumu uzstādīt atbilstoši LVS77 "Ceļa zīmes" un MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām
-Saskaņot novada pašvaldībā
-Savlaicīgi pirms darbu sākšanas informēt sabiedrību par pārbrauktuves slēgšanu (atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 p.26)
-Savlaicīgi pirms darbu sākšanas informēt avārijas un speciālos dienestus par pārbrauktuves slēgšanu
-Saskaņot ar sabiedriska transporta pakalpojumus veicējiem, pasažieru pārvadātāju dienestiem
-Nepieciešamības gadījumā, operatīvi nodrošināt avārijas un speciālo dienesta transporta kustību d/v zonā
-Nodrošināt gājēju kustību

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS UN DARBA VIETAS APRĪKOJUMA SHĒMA

saskaņā ar esošajām normām un prasībam pēc MK noteikumiem Nr.421; LVS77-2; LVS85

Darbu izpildes vieta:	Dzelzceļa pārbrauktuve Nr.123 ceļa posmā Koknese-Pļaviņas km94.362, Kokneses pilsēta, Aizkraukles novads, Koknese, 1905.gada iela.	Izpildāmā darba raksturojums:	Dzelzceļa pārbr. kārtējajs remonts
Darbu izpildītājs:	VAS "Latvijas dzelzceļš" Sliežu ceļu pārvalde VRN40003032065 LV-1547, Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga	Atbildīga persona:	Sliežu ceļu darbi - Anatolijs Gorjajevs t.29532487 Daugavpils rem.nod. vadītājs Autoceļa seguma atjaunošana - Jevgenijs Ļubarskis t.29513521 SIA SĒME CB ģenerāldirektors
Izpildes termiņš:	No 24.11.2026 plkst. 07.00 līdz 27.11.2026 plkst.21.00	Shēmu sastādīja:	SIA "SĒME CB" VRN40103239875, LV-1073, Cesvaines iela 9, Rīga

esošais balsts	
pagaidu balsts	
esoša ceļa zīme	50m 801
pagaidu ceļa zīme	731

Signature not validated

Digitally signed by NORMUNDS NORDENS
Date: 2026.10.19 09:29:58 EEST
Location: VSIA LVC Zemgales reģionālā nodaļa
Reason: Saskaņots.
